


*Projekte verändern –
Wir arbeiten daran!*



www.con-thor.de

Klassisch oder agil? Was mache ich wann?

Workshop mit Überblick, Vergleich, Auswahlhilfe, Tipps


GPM Region Bremen
Bremen, 19. November 2015

Trainer: Thor Möller

Das Gegenteil von gut, ist gut gemeint!

Kurt Tucholski


Projekte verändern –
Wir arbeiten daran!
www.con-thor.de




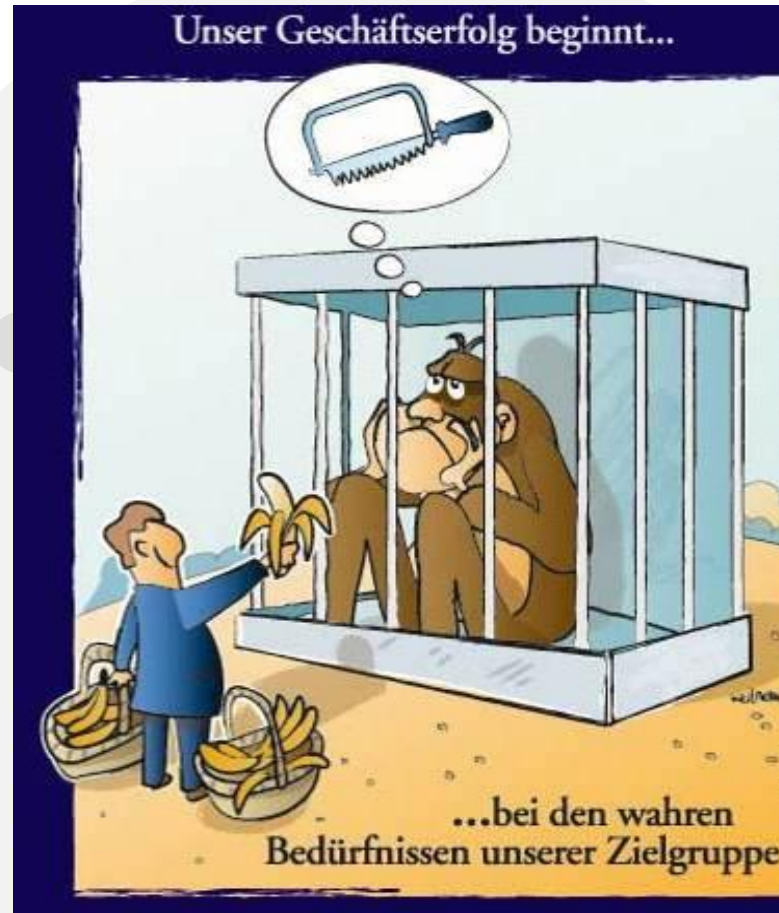



Erreichen wir mit unseren Projekten das, was der Kunde am Ende benötigt?



- 1. Überblick der Ansätze des klassischen und Agilen Projektmanagements**
- 2. Vergleich der Ansätze und Vorstellung von Vorteilen**
- 3. Auswahlhilfe für das jeweils geeignete Verfahren**
- 4. Tipps zur Vertragsgestaltung bei Agilem Projektmanagement**

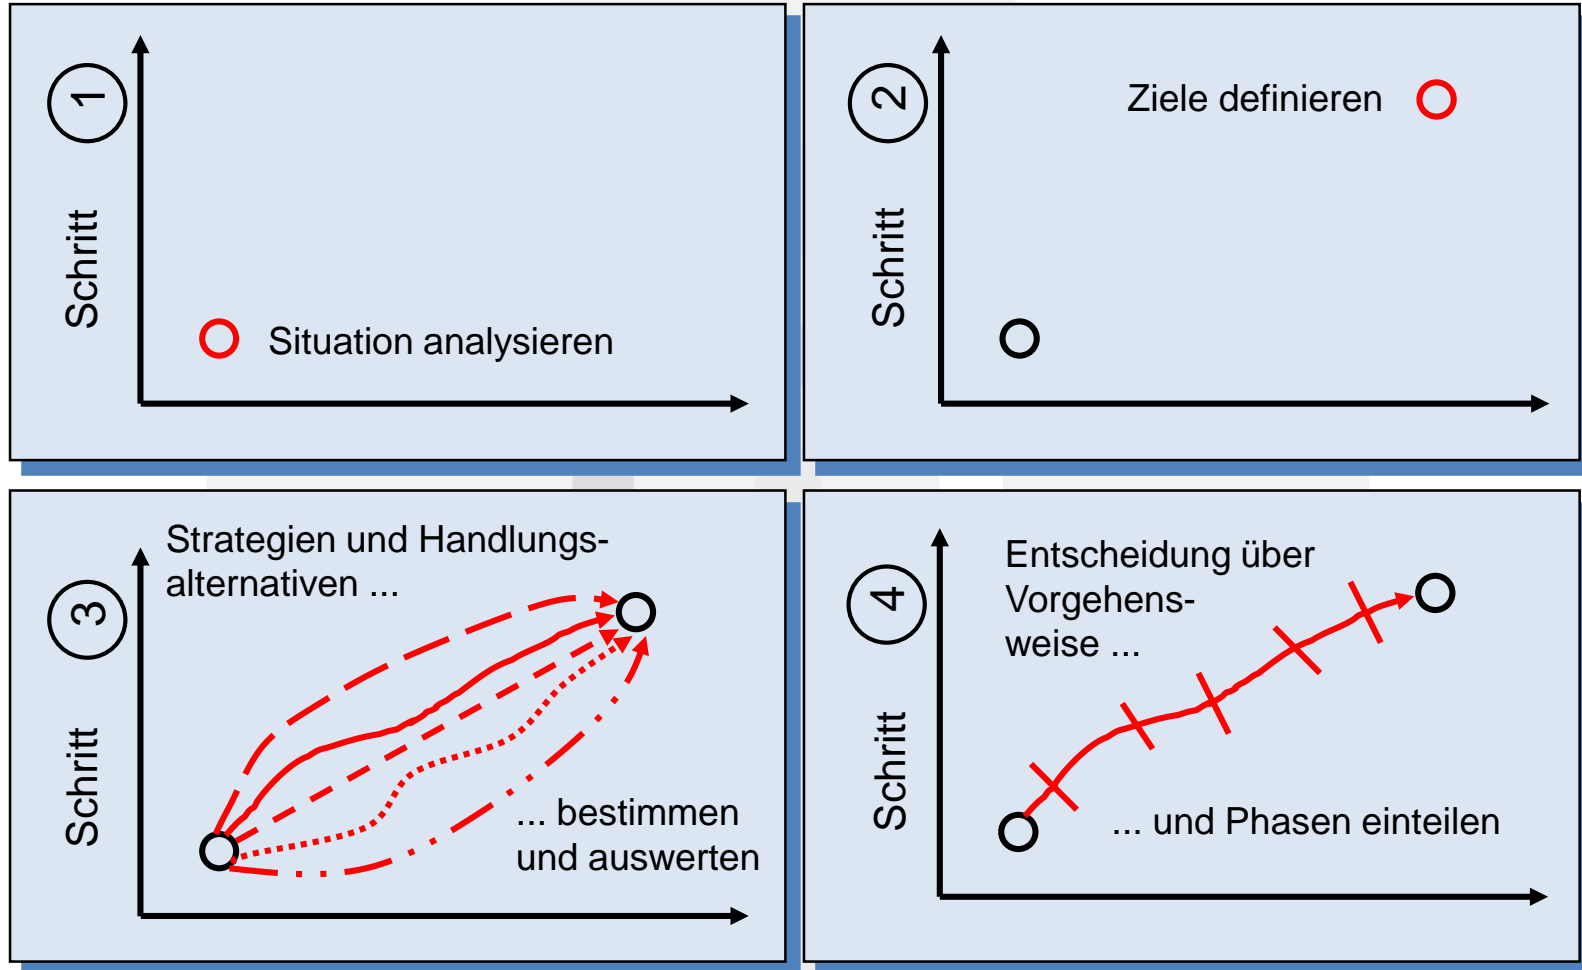


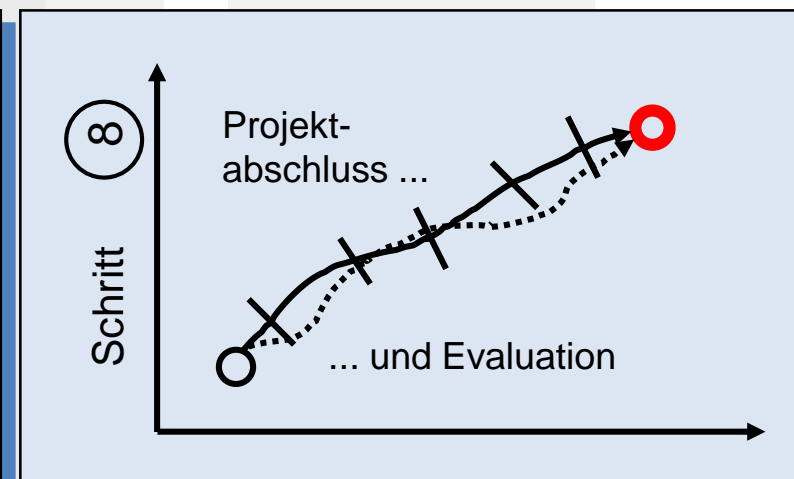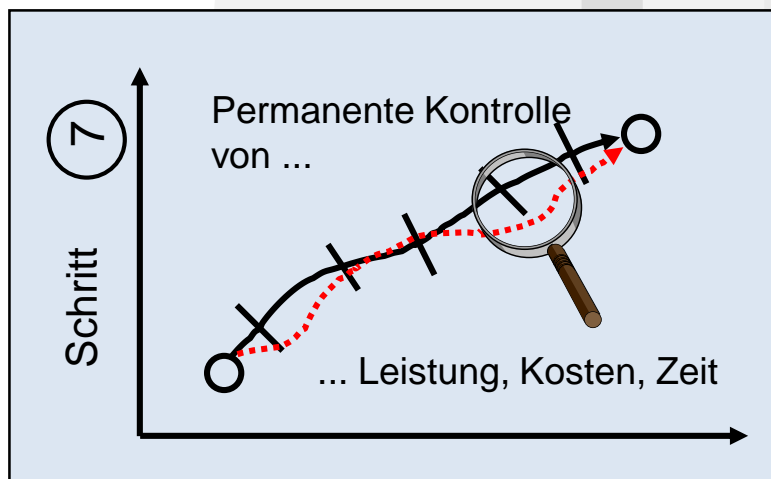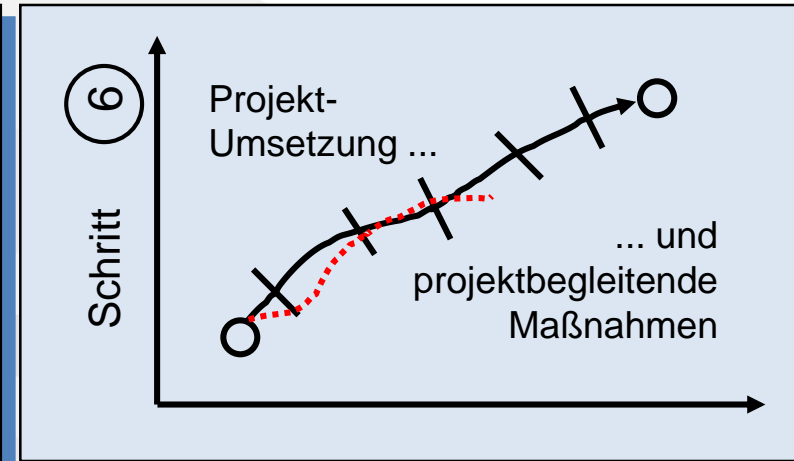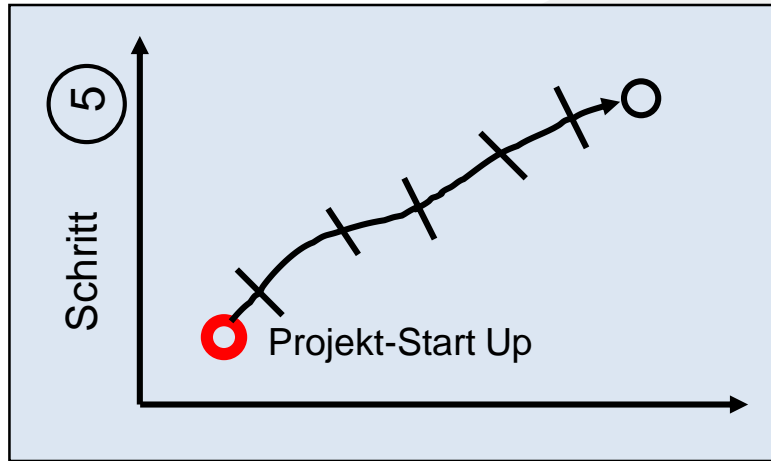

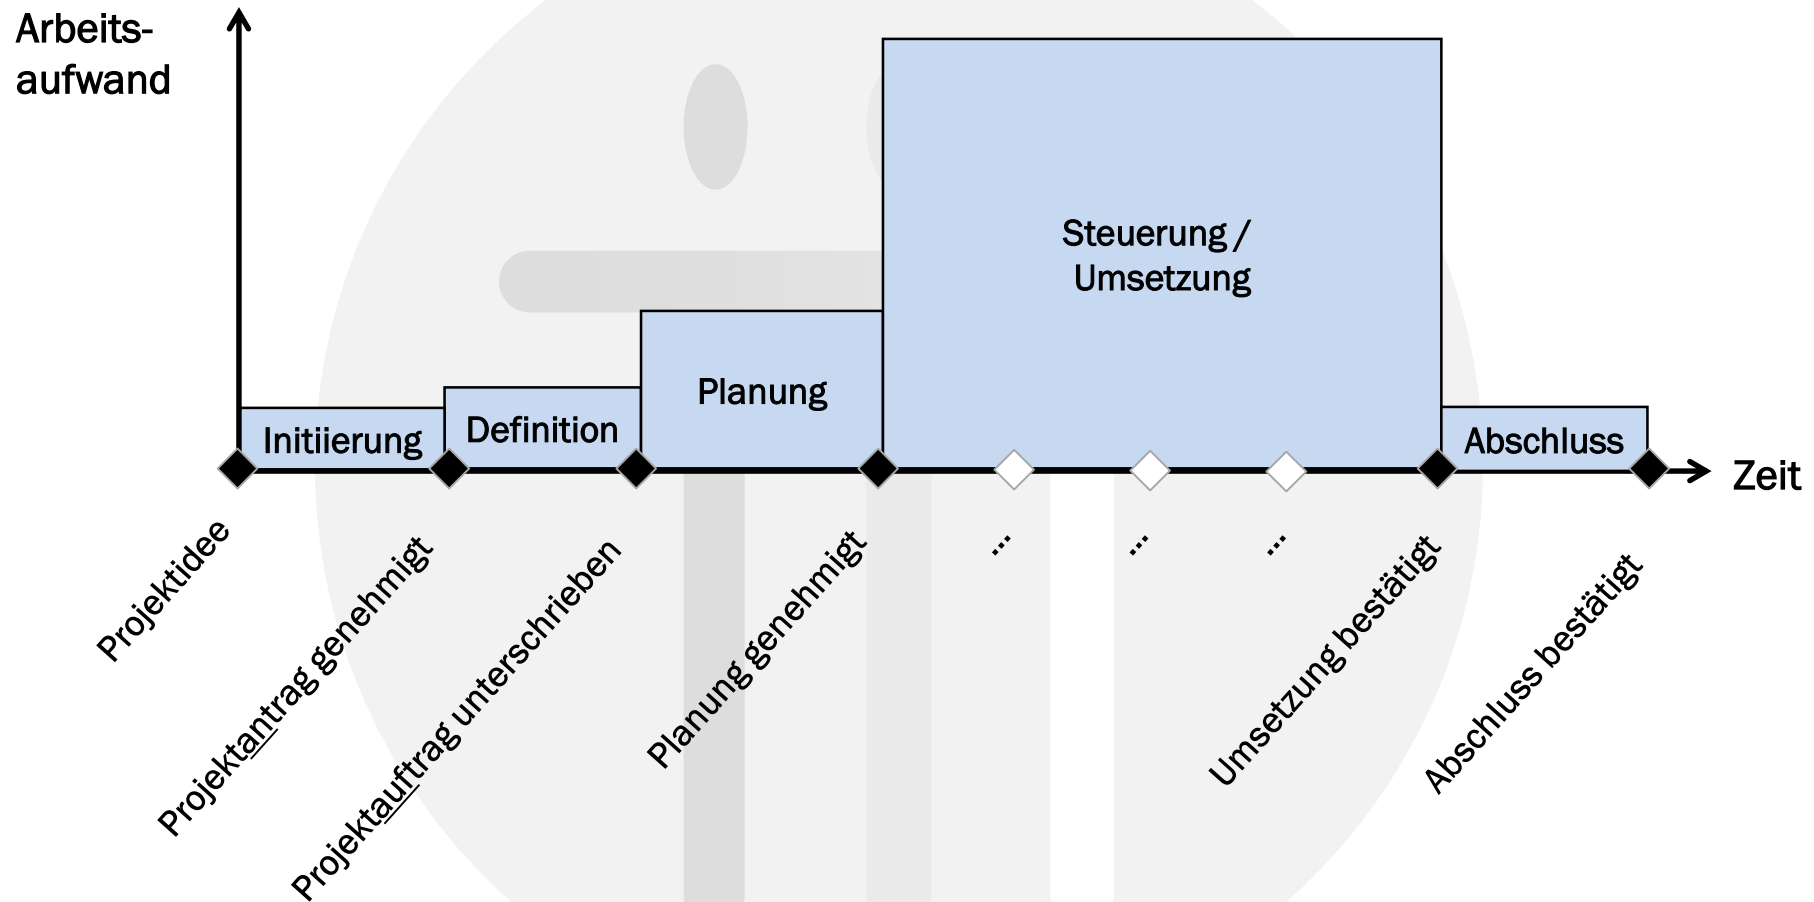



- Individuen und Interaktionen gelten mehr als Prozesse und Tools.
- Funktionierende Programme gelten mehr als ausführliche Dokumentationen.
- Die stetige Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über Verträgen.
- Der Mut und die Offenheit für Änderungen stehen über dem Befolgen eines festgelegten Plans

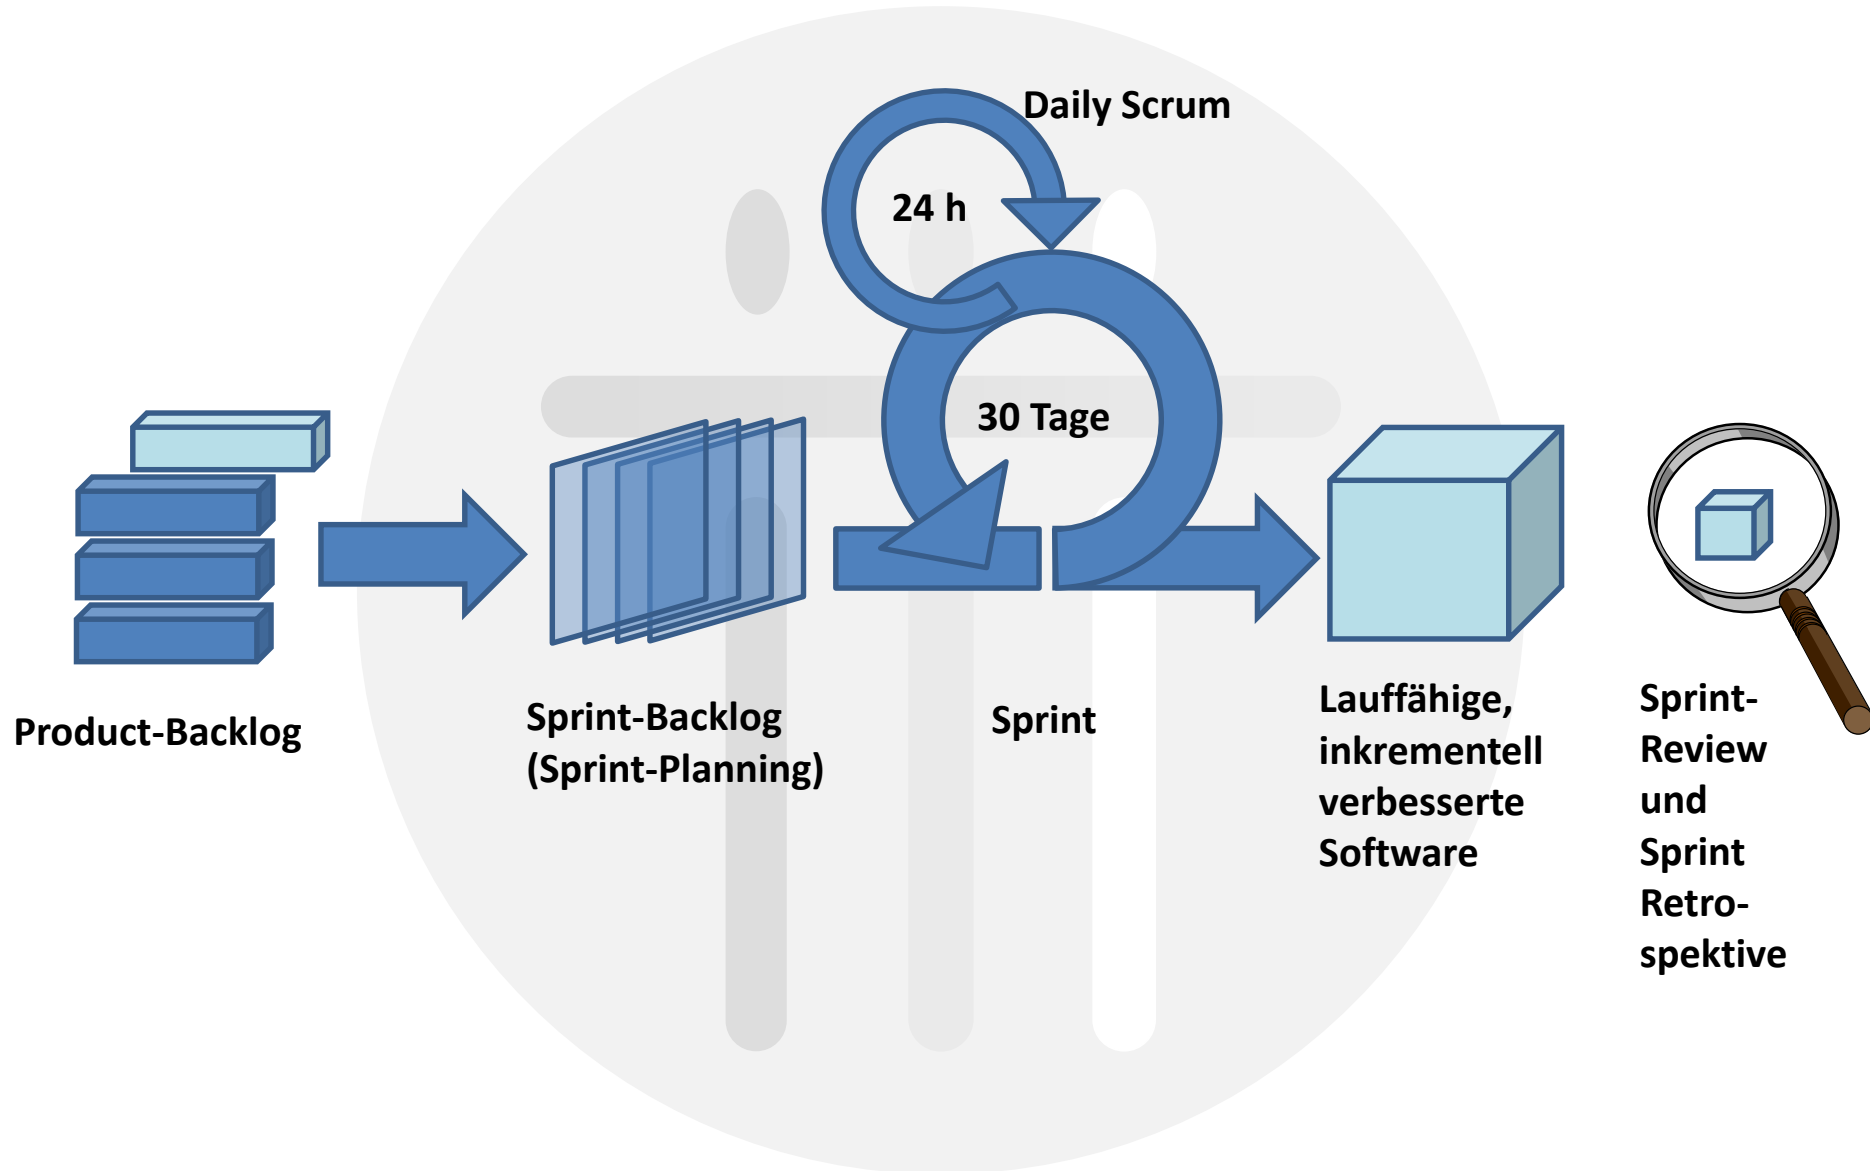





**Man verirrt sich nie so leicht,
wie wenn man glaubt, den Weg zu kennen.**

Chinesische Weisheit

Klassisches PM

Agiles PM

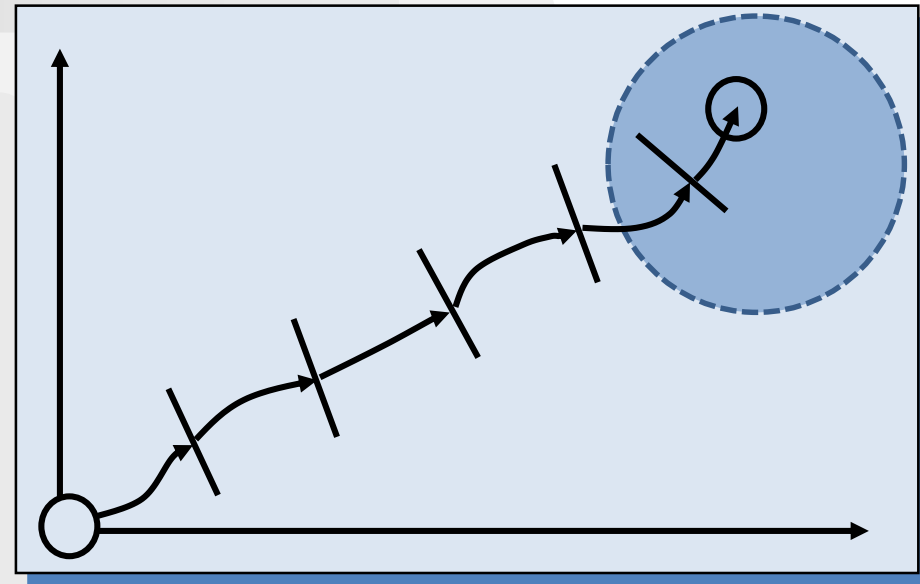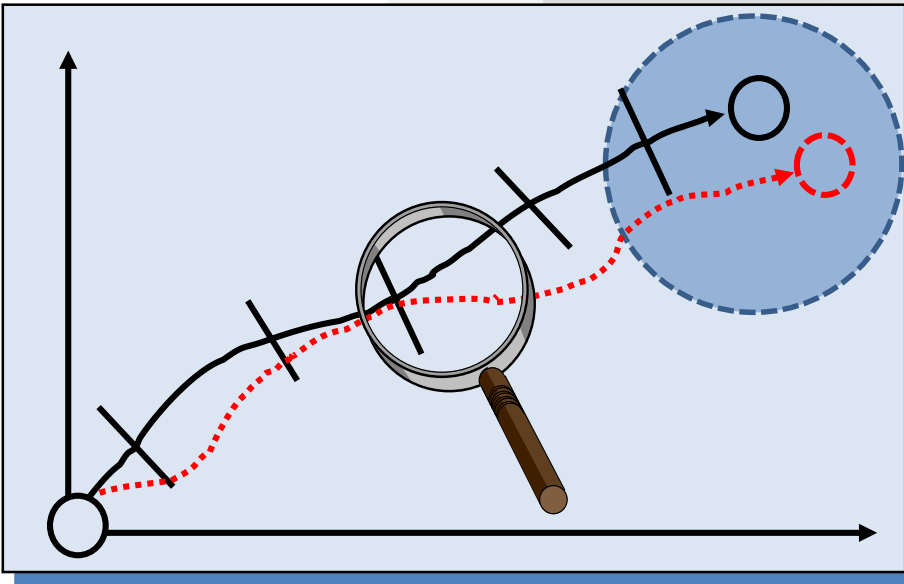



	Klassisches PM	Agiles PM
Vorgehen	Umfassende Prozess- und Methodensammlung	Rahmenwerk
Anwendung	Projektmanager legt Prozesse fest und wählt Methoden aus	Klare Vorgaben, die konsequent umgesetzt werden müssen
Leitungsverantwortung	Projektmanager verantwortet Inhalte und Organisation des Projekts	Product Owner verantwortet die Inhalte und Scrum Master die Organisation des Projekts
...		




	Vorteile
Klassisches PM	<ul style="list-style-type: none">• Höhere Vorhersehbarkeit von Umfang (quantitativ und qualitativ), Kosten und Dauern• Höhere Vertragssicherheit
Agiles PM	<ul style="list-style-type: none">• Mehr Flexibilität der Ergebnisanpassung im Projektverlauf• Kunde erhält eher das, was er am Ende des Projekts benötigt



Wann sollte ich klassisches PM anwenden und wann agiles PM?

Was muss ich bei agilem PM besonders beachten?

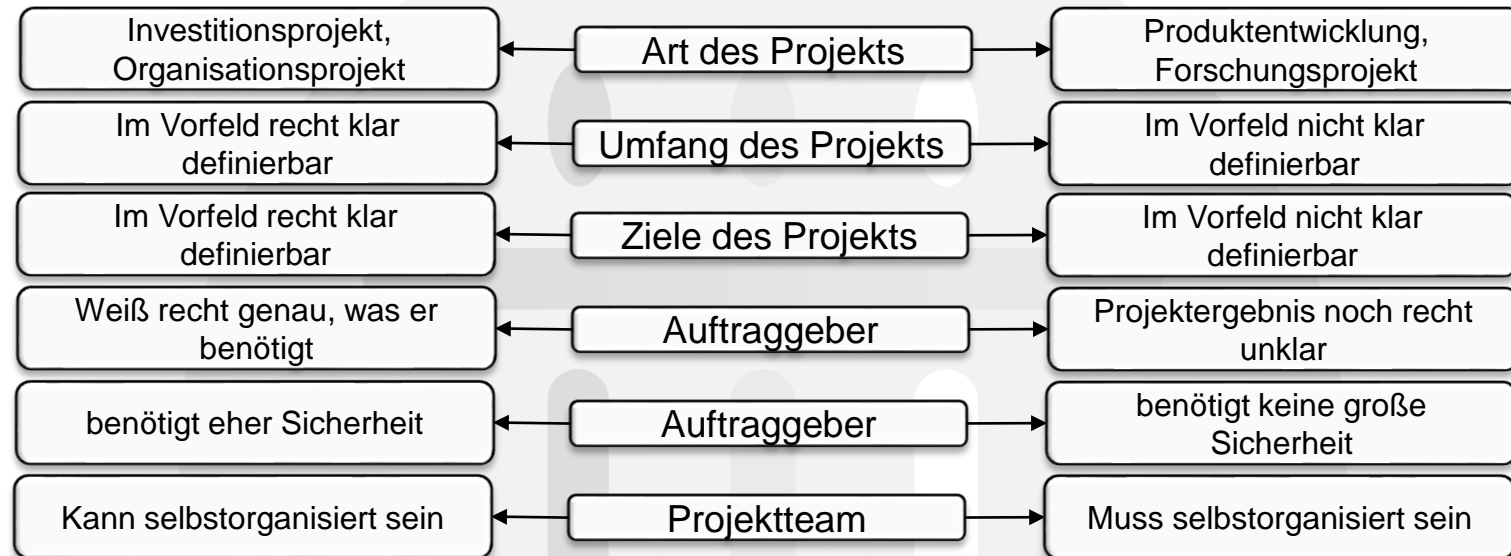

... weitere Aspekte siehe nächste Seite



... weitere Aspekte von Vorseite



eher klassisches PM

eher agiles PM




Probleme bei Dienstvertrag:

- Unsicherheit über Aufwand: AG möchte hier eine Kostensicherheit.
- Produkthaftung: ohne klare Leistungsbeschreibung ist eine Produkthaftung schwer umsetzbar

Probleme bei Werkvertrag:

- Es besteht keine Leistungsbeschreibung, an der sich der Werkvertrag orientieren kann
- Keine Flexibilität und somit Aussetzen der Vorteile der Agilität

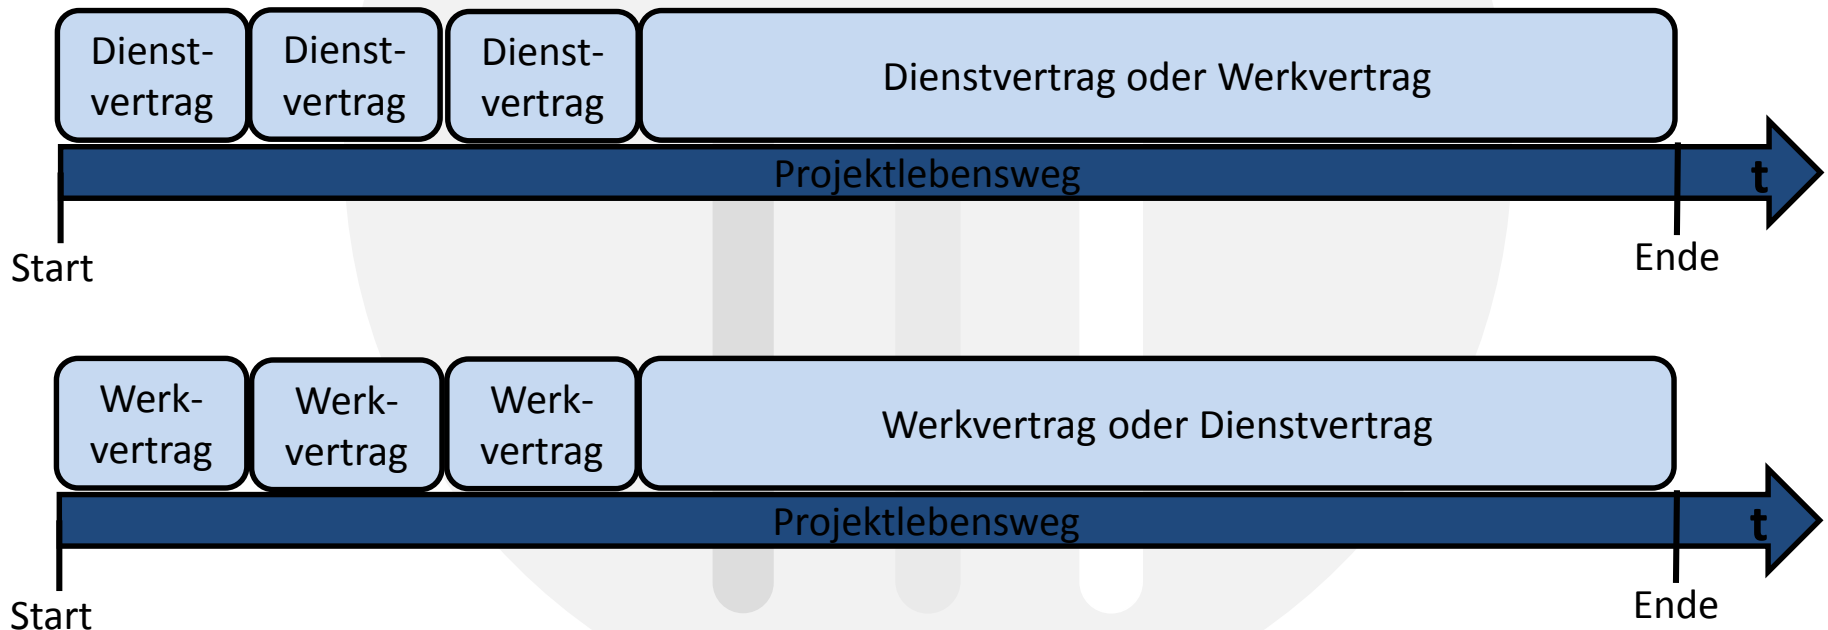



- 1) Wenn Sie gegen das klassische PM argumentieren wollen:

**Man verirrt sich nie so leicht,
als wenn man glaubt den Weg zu kennen.**
(Chinesisches Sprichwort)

- 2) Wenn Sie gegen Agiles PM argumentieren wollen:

**Wir wissen zwar nicht wo wir hinwollen,
aber wir werden uns trotzdem beeilen.**
(Quelle unbekannt)



- Thor Möller studierte Wirtschaftswissenschaft an der Universität Bremen und promovierte in Betriebswirtschaft am Institut für Projektmanagement und Innovation (IPMI).
- Anschließend war er Abteilungsleiter für Betriebswirtschaft im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), bevor er als Berater und Projektleiter bei der ucb Managementberatung GmbH anfang.
- Seit 1995 baut er die con-thor Unternehmensgruppe mit derzeit vier Unternehmen auf.
- Thor Möller war u.a. von 2004 bis 2012 Mitglied des Vorstands in der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.
- Ferner ist er vielfacher Buchautor und hat zahlreiche Artikel insbesondere zum Projektmanagement publiziert. Als Dozent und Trainer ist er weltweit in Unternehmen und Hochschulen aufgetreten.
- Kontakt: thor@con-thor.de
